


LEAN CONSTRUCTION NO BRASIL: Nível de maturidade das empresas em 2020

67 PARTICIPANTES


60 EMPRESAS

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS POR SEGMENTO

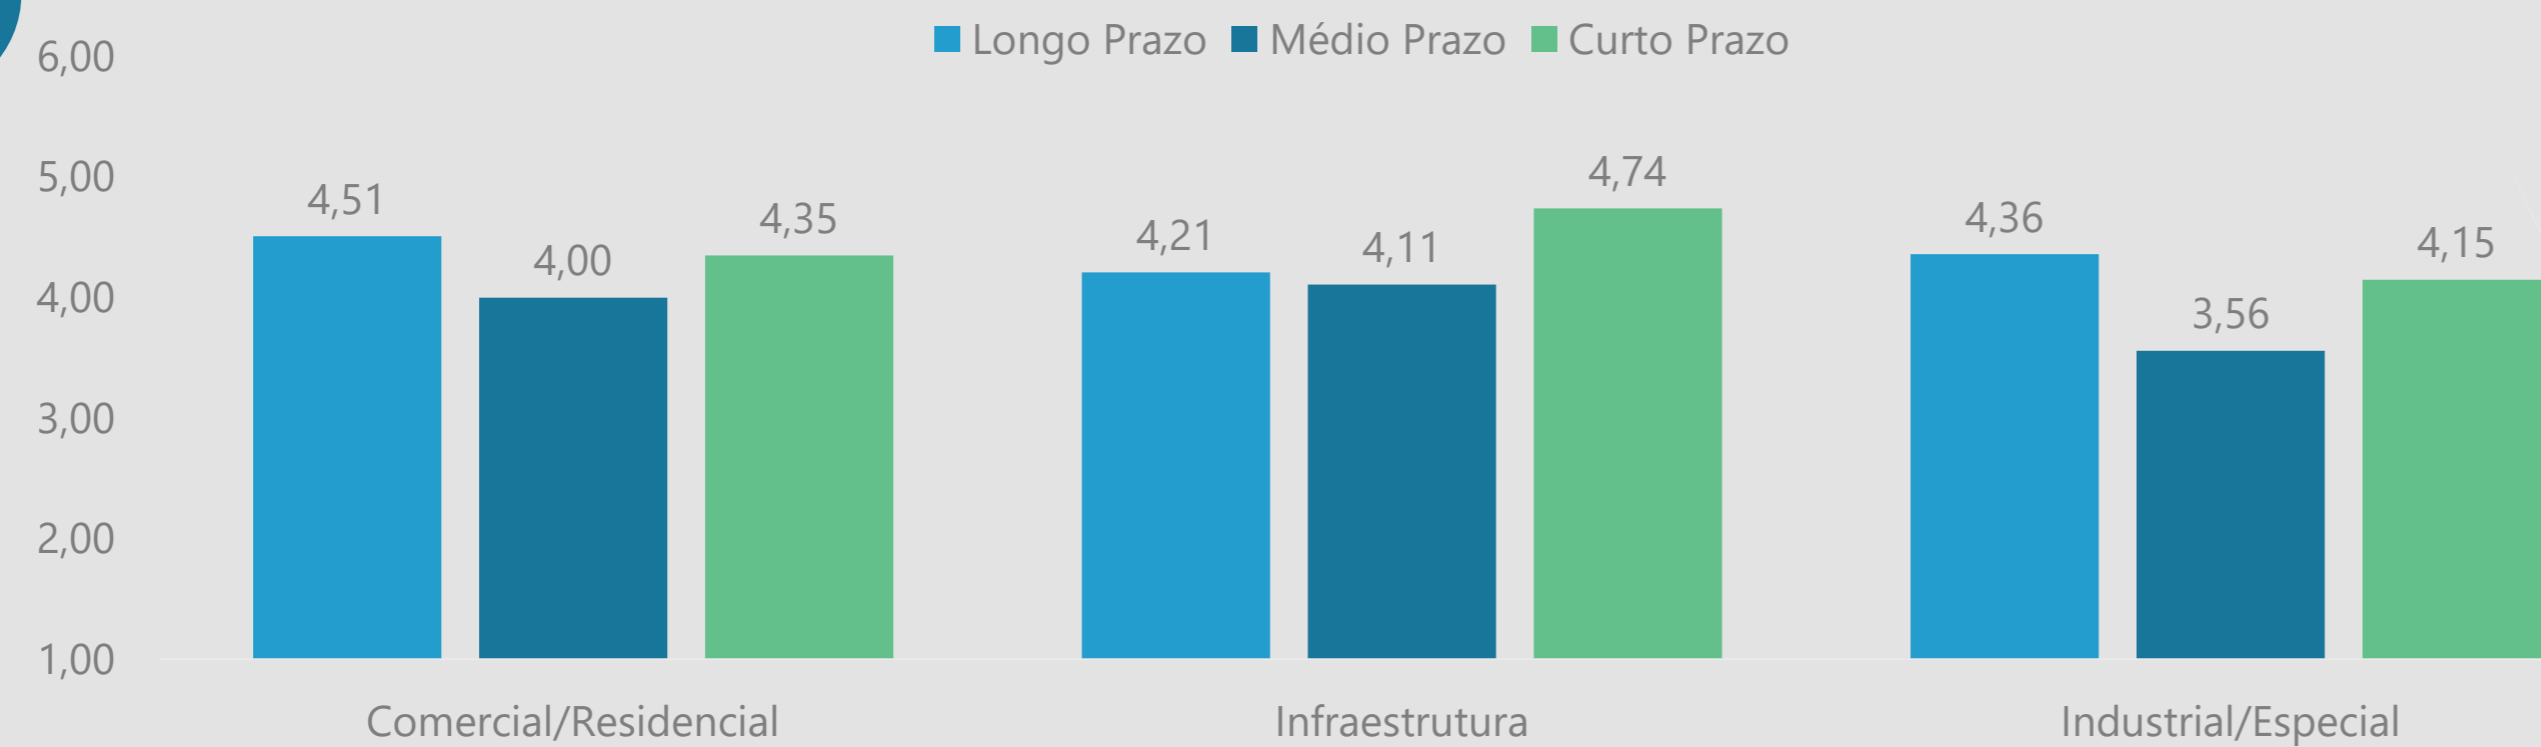


ESTRATÉGICO

Alta utilização das ferramentas e informações geradas a partir do Planejamento Longo Prazo

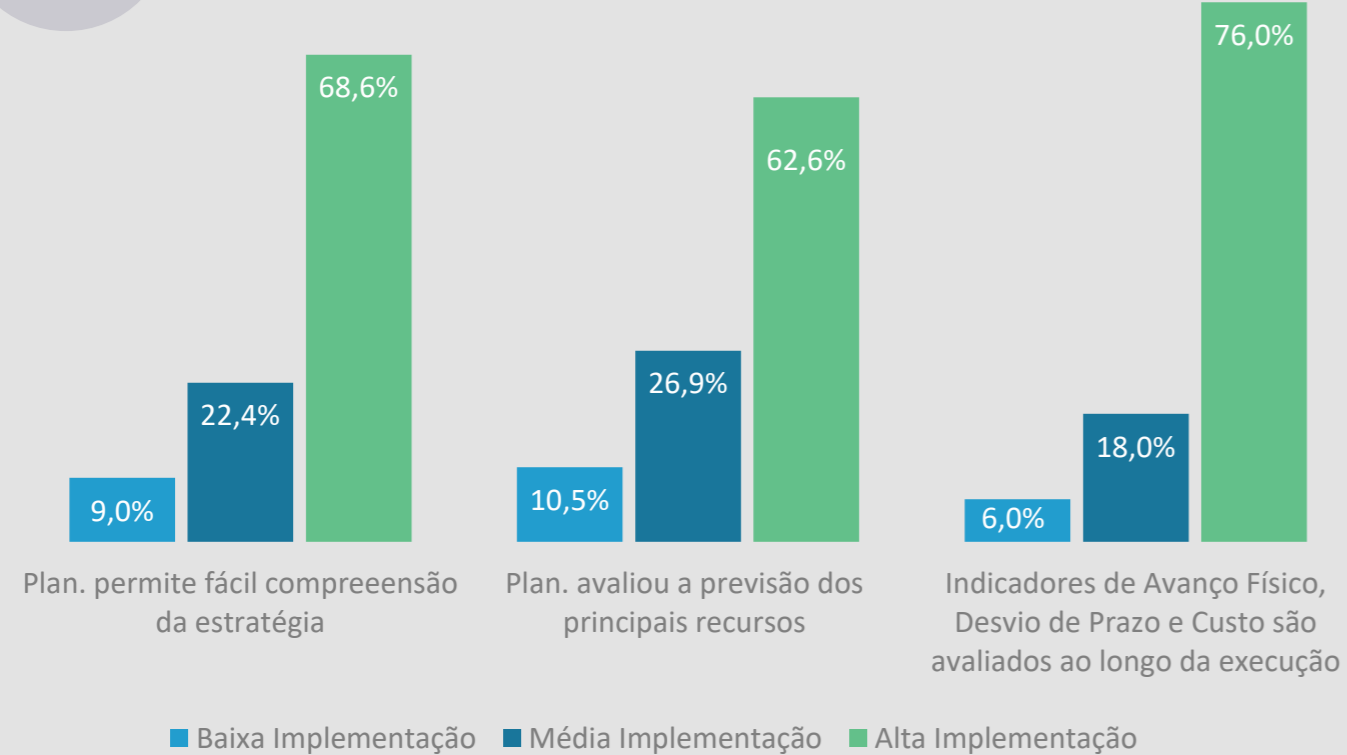

TÁTICO

Elevada maturidade nas Rotinas de médio prazo não se reflete nas dimensões controle e colaboração

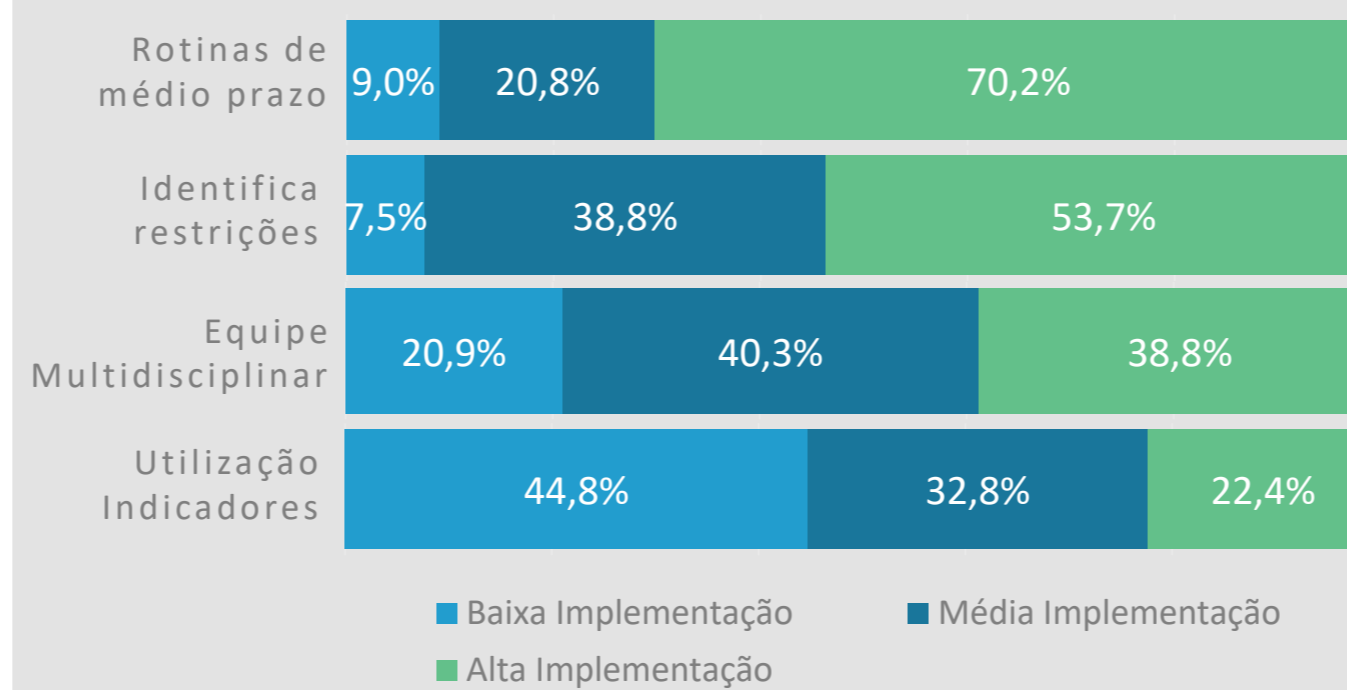

ALAVANCAS IDENTIFICADAS

- PRODUTIVIDADE**
 Maturidade na implementação de indicadores no médio e curto prazo melhoram o controle da produção e resultam em aumento de produtividade
- CHECKIN CHECKOUT**
 O objetivo é levar a meta de Produção ao último nível. Comunicação e controle das frentes operacionais merece ser fortalecida.
- ROTINA PULL PLANNING**
 Incorporado à rotina de médio prazo, objetiva puxar o Planejamento da Produção através do *takt time* aplicado ao caminho crítico.
- COLABORAÇÃO**
 O Lean não é feito sozinho. Colaboração e multidisciplinaridade trazem benefícios que alavancam muitas oportunidades de melhoria
- LAYOUT E FLUXOS FÍSICOS**
 A visão de fluxos físicos e de dimensionamento de layout ainda é um *gap* a ser fortalecido e incorporado às rotinas de planejamento

OPERACIONAL

O nível de maturidade das práticas de curto prazo é decrescente a medida que se aproxima da produção

